



兰州大学

LANZHOU UNIVERSITY

兰州大学
施工动态
基建项目
(第三期)



自强不息 开拓创新



兰州大学基建项目施工动态（2021年第3期）

2021年5月16日-2021年5月31日

基本建设处工程技术科

2021年6月2日

一、在建项目动态

1. 榆中校区综合楼

（一）总体形象进度：屋面工程基本完成。1-4层地砖铺贴完成；3-4层涂料完成，水磨石地面抛光打蜡完成，不锈钢踢脚安装完成。木门安装完成，3层隔断玻璃安装完成。南侧、北侧石材幕墙完成。室外污水、消防管网完成；北侧、西侧沥青道路完成；南侧道路沥青摊铺完成，人行道垫层完成。北侧园林绿化种植土回填完成。室内给排水工程基本完成。3-4层灯具及插座安装完成。

（二）5月下半月形象进度：

1.1-4层地砖铺贴完成，楼梯间水磨石抛光完成，3-4层水磨石地面抛光打蜡完成，2层水磨石地面抛光打蜡完成70%，3-4层不锈钢踢脚安装完成。



图1 水磨石地面抛光打蜡



图2 中庭地砖铺贴完成

2. 3-4层涂料基本完成，3层玻璃隔断玻璃安装基本完成；圆弧区反坎石材完成；楼梯间腻子完成；卫生间石材台面完成。



图3 3-4层涂料完成

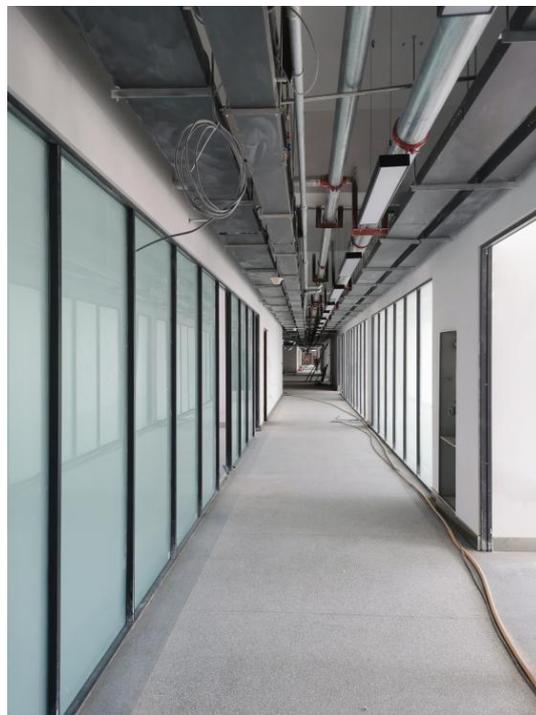


图4 3层玻璃隔断玻璃安装完成

3. 东侧石材幕墙石材、真石漆完成，窗台铝板完成90%（除东门头），东门头石材完成10%；南内庭院石材、真石漆完成，北内庭院石材安装完成；西侧石材完成（除圆弧区），圆弧区次龙骨安装完成。



图5 西北侧幕墙施工现状



图6 东侧幕墙施工现状

4. 室外污水、消防管网完成，雨水管道基本完成。室外西侧、北侧人行道烧结砖完成；内庭院垫层完成；南侧道路沥青摊铺完成；南侧人行道垫层完成。北侧园林绿化种植土回填完成。

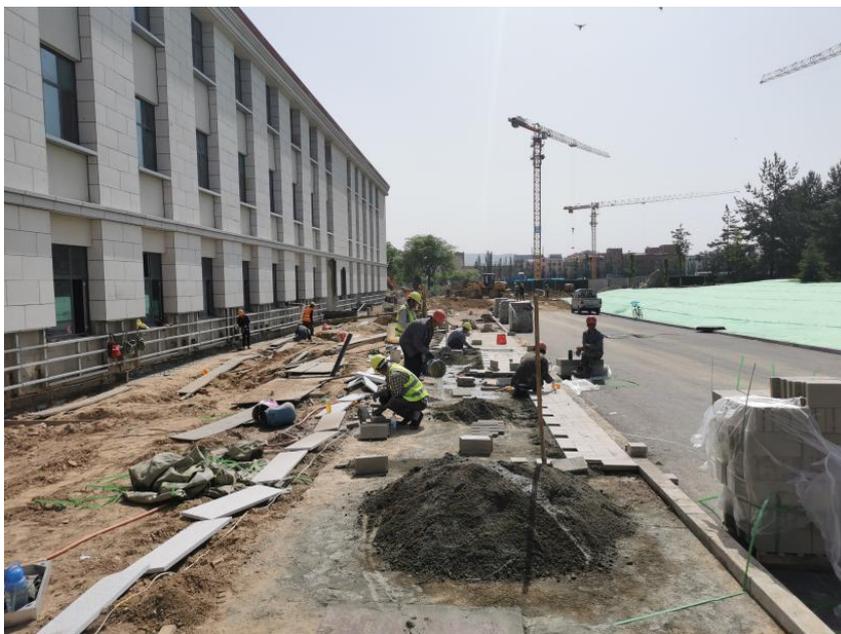


图7 南侧道路施工现状

5. 室内给排水管道工程完成，剩余小便器、台盆、水龙头未安装，通风工程完成95%，空调室内机安装完成。3-4层灯具、插座安装完成，1-4层消防报警工程穿线完成，智能化工程线缆敷设完成。

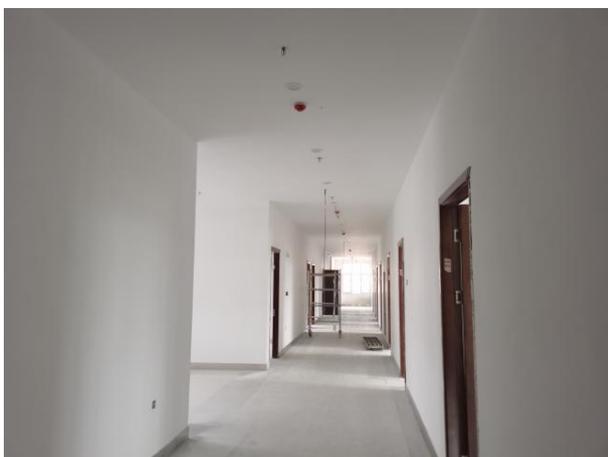


图8 4层室内公共部位灯具安装



图9 3层室内办公区域灯具安装

2.榆中校区第二实验楼

(一) 总体形象进度：1-5层实验室移交实验室与设备管理处，5层公共区域踢脚线完成，2-4层过道亚麻地板完成。给排水工程基本完成；采暖通风工程基本完成，1-5层消防工程完成，灯具安装完成。北侧柱装饰砖、门头装饰砖砌筑完成；钢连廊北侧装饰砖砌筑完成，外墙外保温及真石漆基本完成。室外铺装、道路、绿化基本完成。

(二) 5月下半月形象进度：

1.2-4层过道亚麻地板施工完成，5层过道踢脚线完成，防火玻璃隔断基本完成。室内照明灯具安装完成，1层喷淋系统施工完成，智能化系统线缆敷设完成。



图10 2-4层过道亚麻地面完成



图11 防火玻璃隔断

2.北侧柱装饰砖、门头装饰砖砌筑完成，钢连廊北侧装饰砖完成，玻璃幕墙龙骨安装完成。



图12 北侧装饰砖砌筑完成



图13 钢连廊南侧装饰砖砌筑完成

3.室外南侧、西侧、北侧烧结砖铺装完成，西侧新修马路人行道铺装完成；北侧铺砖道路完成，南侧马路人行道烧结砖铺装完成50%，西侧微地形基本完成，西北侧种植回填土完成；西侧实验田翻地完成，西侧草坪种植完成，北侧花池回填土水沉降完成，内庭院草花种植。



图14 室外铺装及绿化工程基本完成

3.榆中校区人文社科组团 I 项目

(一) 总体形象进度：完成土方开挖、基坑支护、桩基工程，基本完成地基防水和筏板施工；完成临建、样品展示区和安全体验馆。

(二) 5月下半月形象进度：

1.完成1区1-4段、2区1、2、5、6段筏板浇筑。1区2段负2层顶板支模完成，2区4段负2层顶板支模完成。



图15 人文社科组团项目施工现状

2.完成智慧工地展示区装修及设备安装。



图16 范宝军副校长检查指导人文社科组团项目智慧工地展示区
