




兰州大学

LANZHOU UNIVERSITY

兰州大学
施工动态
（第二期）
基建项目



自强不息 开拓创新

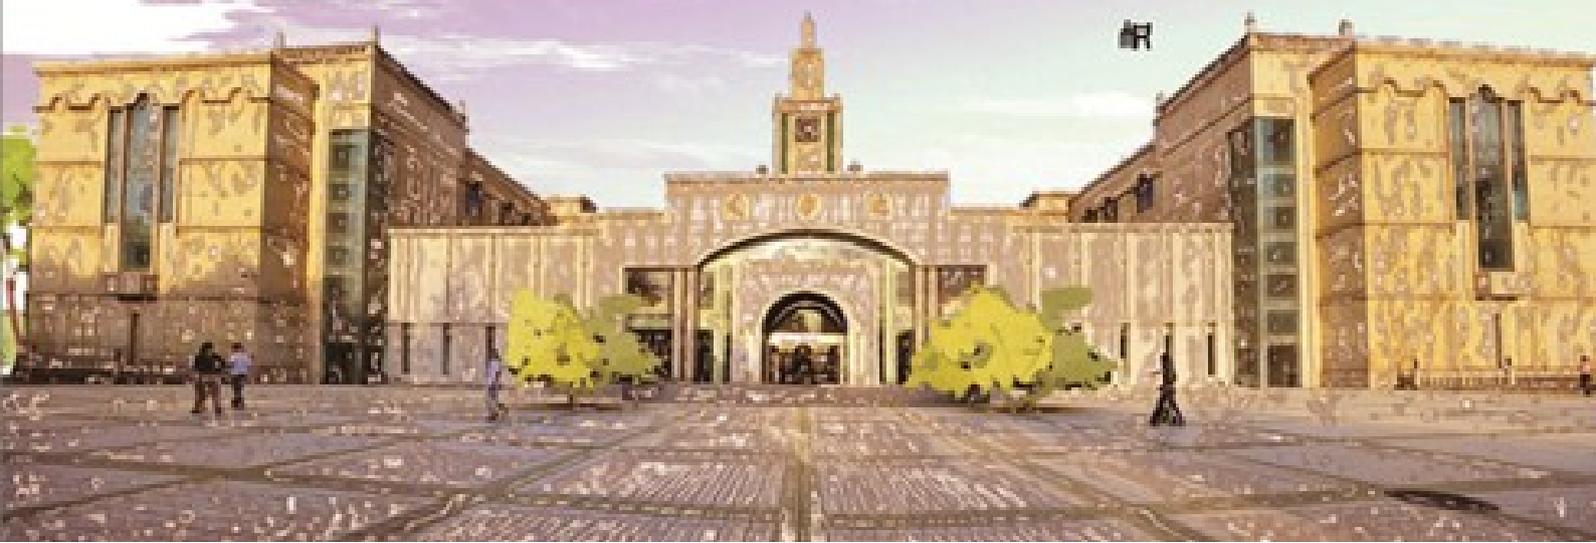

兰州大学基建项目施工动态（2021年第2期）

2021年5月1日-2021年5月15日

基本建设处工程技术科

2021年5月18日

一、在建项目动态

1. 榆中校区综合楼

（一）总体形象进度：屋面基本完成；地砖铺贴完成（除1层中庭），墙面、顶棚腻子及乳胶漆完成约70%，4层水磨石地面抛光打蜡完成，3-4层木门安装完成，2-3层玻璃隔断龙骨完成；机电安装工程正在进行后期设备安装。南、北侧石材幕墙基本完成，东侧石材幕墙完成70%，西南侧石材完成30%。室外西侧、北侧马路完成，南侧道路砂夹石摊铺完成50%。西侧乔木种植完成60%。

（二）5月上半月形象进度：

1. 屋面基本完成，中庭电动排烟窗安装完成50%，中庭柱子腻子完成80%。



图1 综合楼中庭装修施工

2. 完成南、北侧石材幕墙及真石漆施工；东侧石材幕墙石材完成（除东门头），南内庭院石材完成70%，北内庭院石材完成20%，西南侧石材完成30%。



图2 综合楼南侧幕墙石材及真石漆完成



图3 综合楼东侧幕墙石材及真石漆施工

3. 地砖铺贴完成（除1层中庭）；3层吊顶区域乳胶漆完成；楼梯间水磨石二遍打磨完成；4层水磨石地面抛光打蜡完成；3-4层木门安装完成；2-3层玻璃隔断龙骨完成；9、10号楼梯栏杆安装完成。



图4 综合楼室内机电安装施工



图5 综合楼室内装修施工

4. 室外雨污水总管网开挖完成，混凝土垫层完成。西侧、北侧人行道、内庭院垫层完成，南侧道路砂夹石摊铺完成50%。西侧乔木种植完成60%。



图6 综合楼南侧道路砂夹石施工



图7 综合楼西北角乔木种植完成

2. 榆中校区第二实验楼

（一）总体形象进度：2-5层实验室移交实验室与设备管理处进行实验设备安装，过道亚麻地板施工完成80%，机电安装进行后期设备安装。北侧柱装饰砖、门头装饰砖砌筑完成；钢连廊装饰砖完成45%，外墙保温及真石漆完成90%。室外铺装及绿化整体完成90%。

（二）5月上半月形象进度：

1.5月11日2层实验室移交实验室与设备管理处。



图8 第二实验楼二层实验室移交实验室与设备管理处

2.木门安装完成，过道亚麻地板施工完成80%。



图9 第二实验楼室内施工现状

3.北侧柱装饰砖、门头装饰砖砌筑完成；钢连廊玻璃幕墙龙骨安装完成，装饰砖砌筑完成45%。



图10 第二实验楼北侧装饰砖砌筑



图11 第二实验楼钢连廊装饰砖及幕墙施工

4.室外散水施工完成；东侧铺装及绿化施工完成，南侧烧结砖铺装完成95%；西侧烧结砖铺装完成40%；新修西侧马路人行道3:7灰土碾压完成，主路完成；北侧铺砖道路垫层完成，烧结砖铺砖完成95%。南侧场地种植完成；西南、西北侧微地形基本完成，西北侧种植回填土已完成，北侧花池种植土完成30%。



图12 第二实验楼东侧室外铺装绿化完成

3.榆中校区人文社科组团 I 项目

(一) 总体形象进度：完成管沟改造，完成基坑土方开挖及基坑支护，完成桩基础成孔、浇筑和注浆395根；完成临建、样品展示区和安全体验馆。完成电梯采购招标。

(二) 5月上半月形象进度：

1.完成桩基施工。



图13 人文社科组团I项目完成桩基施工

2.完成负2层1区、2区2、5、6段垫层浇筑，完成负2层2区1、4段防水保护层施工，完成负2层1区1-3段防水施工。



图14 人文社科组团I项目防水施工

3.完成智慧工地展示区装修及设备安装。



图15 施工现场主入口劳务实名制设备



图16项目智慧科技体验馆
