




兰州大学
LANZHOU UNIVERSITY

兰州大学 施工动态 （第四期） 基建项目

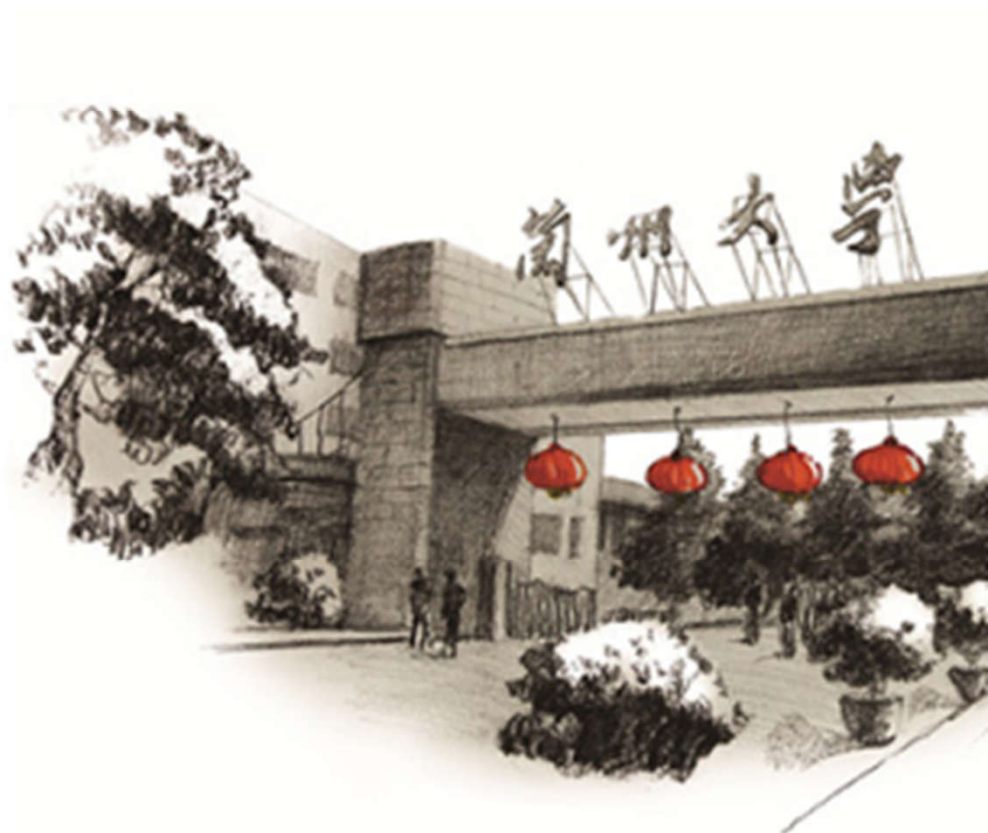

自强不息 奋斗一帜



兰州大学基建项目施工动态（2021年第4期）

2021年6月1日-2021年6月15日

基本建设处工程技术科

2021年6月18日

一、在建项目动态

1. 榆中校区综合楼

（一）总体形象进度：1-4层地砖铺贴完成，水磨石地面抛光打蜡完成，2-4层不锈钢踢脚线安装完成；2-4层腻子涂料完成；木门安装完成；1-3层玻璃隔断玻璃安装完成，3层隔断玻璃门安装完成；铝板金属幕墙完成。南侧、北侧、东侧（除东门头）、南北内庭院石材幕墙石材、真石漆、窗台铝板完成。西侧、北侧、南侧道路完成。3-4层完成通电。

（二）6月上半月形象进度：

1.1-2层水磨石地面抛光打蜡完成，2-4层不锈钢踢脚安装完成。



图1 水磨石地面抛光打蜡



图2 2-4层不锈钢踢脚完成

2.2-4层腻子涂料完成，1-2层玻璃隔断玻璃安装完成，3层隔断玻璃门安装完成。出入口吊顶完成，卫生间施工完成。



图3 3层玻璃隔断门安装完成



图4 卫生间施工完成

3.南、北内庭院真石漆、窗台铝板完成，东门头石材完成90%，圆弧区石材完成50%。



图5 内庭院幕墙施工现状



图6 东侧幕墙施工现状

4. 东、南侧接室内管网管道完成；散水完成，散水排水沟完成80%。南侧人行道烧结砖完成，东侧道路砂夹石完成。东侧挡土墙完成，东北侧回填完成。



图7 南侧室外施工现状



图8 东侧道路施工现状

5. 室内给排水管道工程完成，通风管道及百叶完成。2层灯具、插座安装完成，3-4层完成通电。



图9 2层室内灯具安装



图10 3-4完成通电

2.榆中校区第二实验楼

（一）总体形象进度：1-5层室内移交实验室与设备管理处进行实验设备安装。亚麻地板施工基本完成。机电安装工程正在进行设备安装调试。屋面防水及保护层全部完成，钢连廊玻璃幕墙龙骨安装完成，南侧装饰砖砌筑完成95%；室外绿化、铺装及道路施工完成。

（二）6月上半月形象进度：

1.2-4层过道踢脚线完成，灯具安装完成，卫生间施工完成。地下车库喷淋系统完成80%。



图11 卫生间施工完成

2.钢连廊南侧装饰砖砌筑完成约80%。



图12 钢连廊南侧装饰砖砌筑

3.室外南侧人行道铺装完成，北侧钢连廊前石材铺装完成，内庭院铺装及门口平台铺装完成。实验楼西侧草坪、草花种植完成，内庭院草花种植完成约50%。



图13 内庭院施工现状

3.榆中校区人文社科组团 I 项目

（一）总体形象进度：完成基坑土方开挖及基坑支护；完成桩基础成孔、浇筑和注浆；完成1区3段和2区1段、4段负二层顶板混凝土浇筑。

（二）6月上半月形象进度：

1. 1区1段负2层顶板混凝土浇筑完成70%，1区2段负2层顶板浇筑完成85%，1区3段负2层顶板浇筑完成，1区4段负2层顶板混凝土浇筑完成95%，2区1段负2层顶板混凝土浇筑完成，2区2段负2层顶板混凝土浇筑完成70%，2区3段垫层混凝土浇筑完成，2区4段负2层顶板混凝土浇筑完成，2区5段负2层顶板混凝土浇筑完成80%，2区6段负2层顶板支模完成70%。



图14 人文社科组团 I 项目施工现状

2.承办了兰州市建设工程质量安全观摩会暨建筑施工本质安全培训讲座。



图15 参会代表现场观摩



图16 副校长范宝军出席讲座并致辞

4.榆中校区环境提升改造（一期）工程

（一）总体形象进度：原有铺装石材保护性拆除完成，原有楼房基础拆除完成70%，施工围挡搭建完成80%，场地平整完成60%。

（二）6月上半月形象进度：

1.原有铺装石材保护性拆除完成，原有铺装石材垫层拆除完成，围挡及广告喷绘完成80%。原有楼房基础拆除完成70%，场地平整完成60%。



图17 榆中校区环境提升改造（一期）工程施工现状
