



兰州大学
LANZHOU UNIVERSITY

兰州大学
施工动态
（第五期）
基建项目



自强不息
开拓创新



兰州大学基建项目施工动态（2021年第5期）

2021年6月16日-2021年6月30日

基本建设处工程技术科

2021年7月4日

一、在建项目动态

1. 榆中校区综合楼

（一）总体形象进度：1-4层地砖铺贴完成，水磨石地面抛光打蜡完成，1-4层不锈钢踢脚安装完成；1-4层腻子涂料完成；木门安装完成，1-3层玻璃隔断安装完成；玻璃幕墙完成，铝板幕墙完成。南侧、北侧、东侧、南北内庭院石材幕墙石材、真石漆、窗台铝板完成。西侧、北侧、南侧道路完成。2-4层完成通电。

（二）6月下半月形象进度：

1-4层水磨石地面抛光打蜡完成，1-4层不锈钢踢脚安装完成。



图1 水磨石地面抛光打蜡完成



图2 1-4层不锈钢踢脚完成

2. 1-4层腻子涂料完成，1-3层玻璃隔断玻璃安装完成，1-3层隔断玻璃门安装完成，执手安装完成。出入口吊顶完成，卫生间施工完成。



图3 室内施工现状

3.南、北内庭院真石漆、窗台铝板完成，东门头石材、真石漆完成，圆弧区石材完成90%。



图4 东侧幕墙施工现状



图5 西侧幕墙施工现状



4. 东、南侧接室内管网管道完成；散水完成，散水排水沟完成80%。南侧人行道烧结砖完成，东侧道路砂夹石完成。东侧挡土墙完成，行道树种植完成。



图6 东侧室外施工现状



图7 北侧室外施工现状

5. 室内给排水管道工程完成，通风管道及百叶完成。1-4层灯具安装基本完成，1-4层开关插座面板安装完成；2层通电完成，3-4层无线AP、广播设备及监控摄像头安装完成。



图8 2-4层通电

2.榆中校区第二实验楼

(一) 总体形象进度：1-5层室内移交实验室与设备管理处进行实验设备安装。亚麻地板施工完成。屋面工程完成，钢连廊玻璃幕墙龙骨安装完成，采光顶、幕墙玻璃安装95%，南侧装饰砖砌筑完成；室外绿化、铺装及道路施工完成。

(二) 6月下半月形象进度：

1. 1-5层过道踢脚线完成，室内修补完成，卫生间施工完成。



图9 卫生间施工完成

2.钢连廊南侧装饰砖砌筑完成，钢连廊玻璃幕墙龙骨安装完成，采光顶、幕墙玻璃安装完成95%。



图10 钢连廊施工现状

3.南侧人行道铺装完成，钢连廊北侧石材铺装完成，内庭院铺装完成。西侧草坪、草花种植完成，内庭院草花种植完成约70%。



图11 内庭院施工现状

4. 空调室外机冷凝水管道及冷媒管安装完成；地下车库喷淋及消防栓系统完成80%，实验室特殊气体风管安装完成80%。室内照明灯具及疏散指示灯基本安装完成；1-5层电磁锁及闭门器安装完成。

3.榆中校区人文社科组团 I 项目

（一）总体形象进度：完成基坑土方开挖及基坑支护；完成桩基础成孔、浇筑和注浆；完成1区1-4段和2区1-2段、4-6段负二层顶板混凝土浇筑。

（二）6月下半月形象进度：

1. 1区1段负2层顶板混凝土浇筑完成，1区2段负1层顶板脚手架搭设完成，1区3段负1层顶板模板完成，1区4段负1层顶板模板完成50%，1区5段负1层垫层混凝土浇筑完成，2区2段负1层顶板脚手架完成80%，2区3段混凝土浇筑完成，2区4段负1层顶板脚手架搭设完成，2区5段负1层顶板脚手架搭设完成50%，2区6段负1层顶板脚手架搭设完成50%。

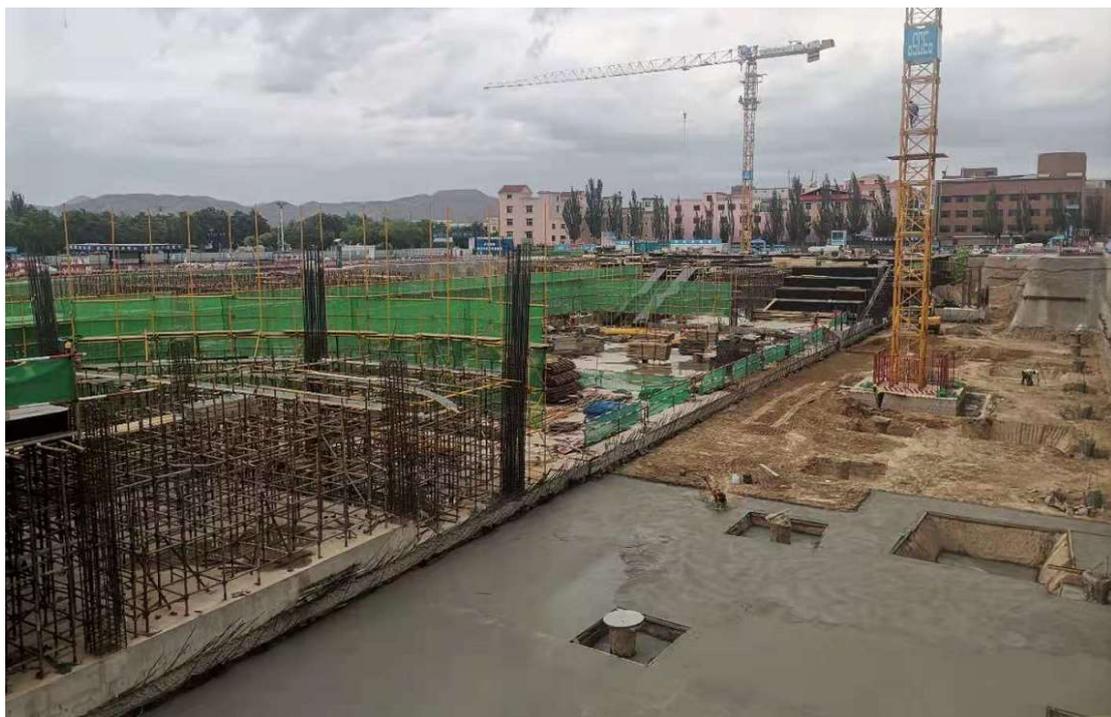


图12 人文社科组团 I 项目施工现状（一）



图13 人文社科组团 I 项目施工现状（二）

4.榆中校区环境提升改造（一期）工程

（一）总体形象进度：拆除工程完成，场地平整完成，绿化地微地形完成20%。



（二）6月下半月形象进度：

1.原有铺装石材保护性拆除完成，原有楼房基础拆除完成，施工围挡搭建完成，场地平整完成，微地形完成20%。



图14 榆中校区环境提升改造（一期）工程施工现状
