




兰州大学

LANZHOU UNIVERSITY

兰州大学 施工动态 （第六期） 基建项目



自强不息 开拓创新



兰州大学基建项目施工动态（2021年第6期）

2021年7月1日—2021年7月15日

基本建设处工程技术科

2021年7月22日

一、在建项目动态

（一）榆中校区综合楼

1.总体形象进度：1-4层地砖铺贴完成，水磨石地面抛光打蜡完成，不锈钢踢脚安装完成；1-4层腻子涂料完成；木门安装完成，1-3层玻璃隔断安装完成；玻璃幕墙完成；铝板金属幕墙完成；石材幕墙石材、真石漆、窗台铝板完成。西侧、北侧、南侧道路完成，东侧道路水稳层完成；行道树种植完成。1-4层灯具及开关插座安装完成，电缆敷设完成95%，监控、门禁、广播、无线网络系统设备安装完成，正在进行设备调试。

2.7月上半月形象进度：

（1）屋面GRC栏杆完成，室内装饰装修基本完成。



图1 屋面GRC栏杆安装完成



图2 室内现状

(2) 出入口门安装完成，内庭院铺装完成90%，绿化回填土完成。



图3 东出入口门安装完成



图4 内庭院施工现状

(3) 西侧石材、窗台铝板、真石漆完成，东门头雨篷完成90%。



图5 西侧幕墙施工现状



图6 东侧幕墙施工现状

(4) 散水完成，散水排水沟完成。东侧人行道烧结砖完成，东侧道路水稳层完成。行道树种植完成。



图7 南侧室外施工现状



图8 东侧道路施工现状

（二）榆中校区第二实验楼

1.总体形象进度：1-5层室内移交实验设备管理处进行实验设备安装；室内装饰装修基本完成；中庭楼梯铝板装饰完成10%。屋面防水及保护层全部完成，钢连廊玻璃幕墙及采光顶完成，装饰砖砌筑完成；外墙外保温及真石漆完成。室外绿化、铺装及道路完成。灯具及开关插座安装完成；门禁、监控、广播系统安装完成，正在进行系统调试。

2.7月上半月形象进度：

（1）室内装饰装修基本完成，中庭楼梯铝板装饰完成10%。



图9 室内装饰装修现状

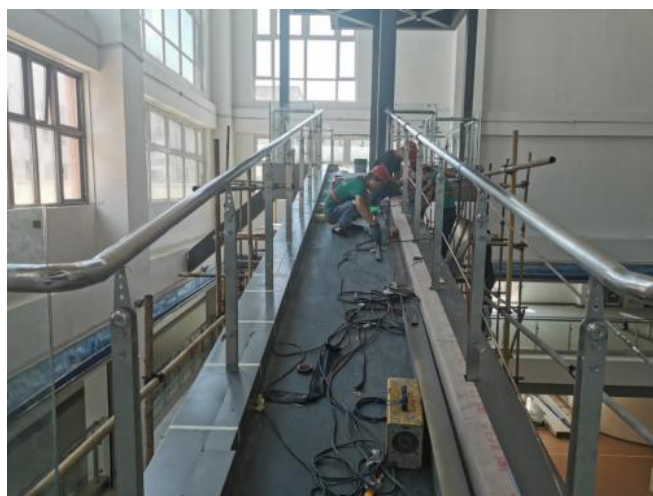


图10 中庭铝板施工现状

(2) 钢连廊玻璃幕墙及采光顶完成。



图11 钢连廊玻璃幕墙完成



图12 钢连廊玻璃采光顶完成

(3) 北侧钢连廊散热器安装完成，喷淋系统安装完成；监控系统安装完成90%；广播安装完成95%；门禁系统调试完成；实验室特殊气体风管安装完成；挡烟垂壁安装完成60%。



图13 钢连廊喷淋系统完成



图14 门禁系统调试完成

（三）榆中校区人文社科组团 I 项目

1.总体形象进度：完成基坑土方开挖及基坑支护；完成桩基础成孔、浇筑和注浆；完成1区1-4段和2区1-2段、4-6段负2层顶板混凝土浇筑，完成1区5段垫层混凝土浇筑和2区3段负2层钢筋绑扎。

2.7月上半月形象进度：

1区1段负1层顶板模板完成80%，1区2段负1层顶板模板完成，1区3段负1层顶板模板完成，1区4段负1层顶板模板完成，1区5段负1层筏板钢筋完成60%，2区2段负1层顶板模板完成80%，2区3段负2层钢筋完成90%，2区4段负1层顶板模板完成，2区5段负1层顶板模板完成，2区6段负1层顶板模板完成。

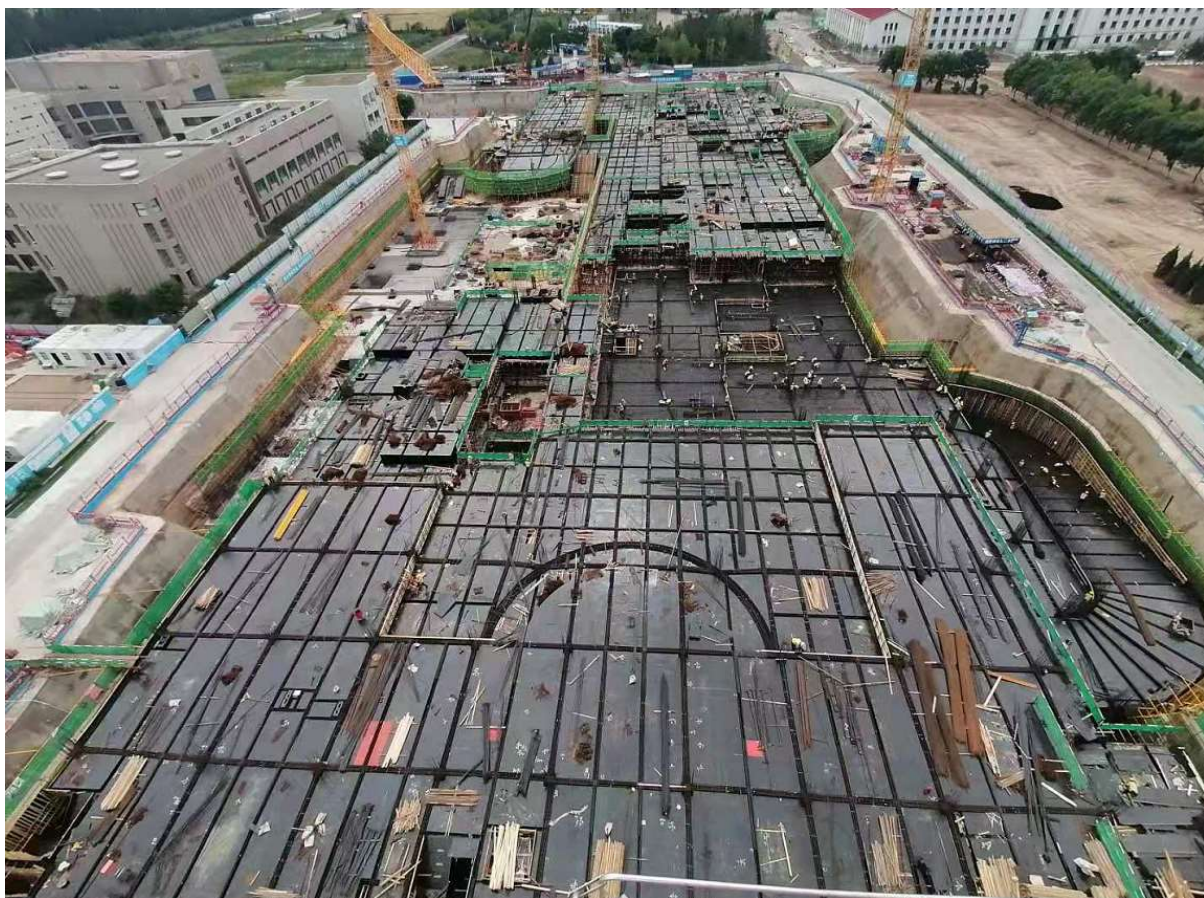


图15 人文社科组团 I 项目施工现状

（四）榆中校区环境提升改造（一期）工程

1.总体形象进度：原有铺装石材保护性拆除完成，原有楼房基础拆除完成。场地平整完成，微地形完成，给水管敷设完成70%，原有树木移栽完成20%，强电管道敷设完成10%，铺装完成8%。地块三人行道铺装完成50%。

2.7月上半月形象进度：

绿化微地形完成，给水管敷设完成70%，原有树木移栽完成20%，强电管道敷设完成10%，铺装完成8%，地块三人行道破损及清运完成，地块三人行道垫层完成，地块三人行道铺装完成40%。



图16 榆中校区环境提升改造（一期）工程施工现状

（五）观云楼五层维修改造工程

1.总体形象进度：拆除及垃圾外运完成；超净室围护结构安装完成80%；空调室内机安装完成50%；风管安装完成20%；桥架安装完成60%。

2.7月上半月形象进度：

拆除工程完成，垃圾外运完成。超净室围护结构安装完成80%；空调室内机安装完成50%，风管安装完成20%，桥架安装完成60%。

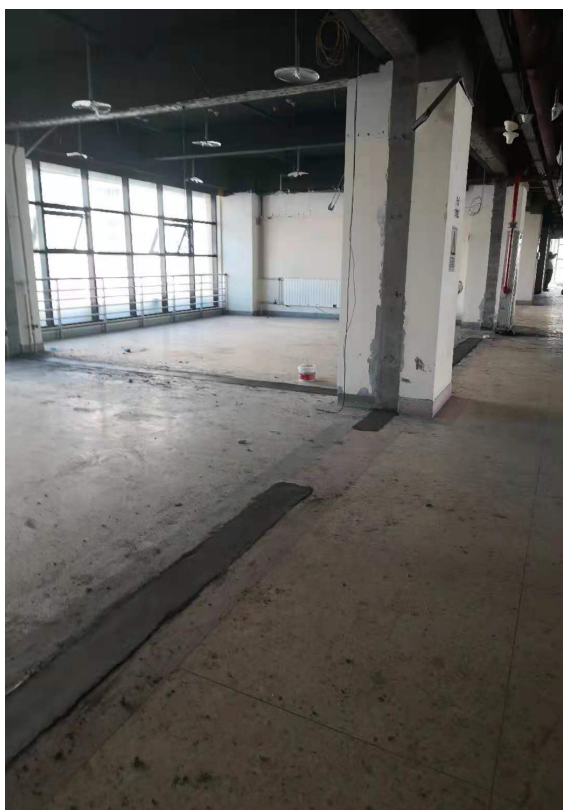


图17 室内拆除工程完成



图18 超净室围护结构施工
